



CONFIND S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei

CONSTRUCTIE DEPOZIT BACAU

Proiect no. Y900008

Antreprenor General : SC CONFIND SRL

Data : 06.11.2013

1. INTRODUCERE

1.1 Scopul Proiectului

Proiectul "Modernizare Depozit Bacau" a avut ca scop eficientizarea si marirea capacitatii de stocare a depozitului de produse petroliere(benzina, motorina) existent. Depozitul Bacau a fost operational din anul 1975 si utilizat pana la inceputul lucrarilor de modernizare pentru stocarea acestor tipuri de produse petroliere.

Depozitul existent a fost modernizat, urmarind urmatoarele obiective principale ale proiectului:

- ✓ Imbunatatirea fiabilitatii printr-un proces eficient din punct de vedere economic
- ✓ Exploatarea in conditii de siguranta operationala
- ✓ Indeplinirea cerintelor legale de mediu
- ✓ Reducerea costurilor operationale si de intretinere
- ✓ Imbunatatirea sistemelor de monitorizare si comanda
- ✓ Respectarea politicii HSE OMV PETROM si a celor 8 Reguli de Aur

1.2 Principalele lucrari mecanice in cadrul Proiectului "Modernizare Depozit Bacau-Constructie Rezervoare si Legaturi Conduce"

In cadrul proiectului s-au executat, in principal, urmatoarele categorii de lucrari:

- Constructie rezervoare noi stocare produs :
 - Rezervor motorina-10000mc
 - Rezervor benzina-5000mc
- Constructie statii pompare :
 - Statie pompe PSI (sistem spuma si racire)
 - Statie pompe descarcare cisterne CF
 - Statie pompe incarcare cisterne auto
- Montaj instalatie VRU
- Montaj skid incarcare cisterne auto
- Vase subterane :
 - Rezervor 60mc pentru aditivi
- Legaturi conduce :
 - ME 500-legaturi conduce rampa cale ferata
 - ME 501- legaturi conduce statie pompe cale ferata
 - ME 502- legaturi conduce zona rezervoare
 - ME 503- legaturi conduce statie pompe incarcare
 - ME 504- legaturi conduce statie incarcare autocamioane
 - ME 505- legaturi conduce instalatie recuperare vapori
 - ME 506- legaturi conduce depozitare aditivi
 - ME 507- legaturi conduce sistem ape uzate industriale

S.C. CONFIND S.R.L. CAMPINA 105600

Str. Progresului Nr.2 Tel/Fax 0040 244 - 33 31 60; - 37 47 19

www.confind.ro e-mail : confind@confind.ro



GSI SLV
München



CONFIND S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei

- FP 500-legaturi conducte sistem PSI

2.0 Prezentare proiect

2.1 Date generale

Proiectul "Modernizare Depozit Bacau-Constructie Rezervoare si legaturi conducte" este marca SC CONFIND SRL de la inceput pana la finalizare. Etapele acestui proiect au fost urmatoarele:

- Proiectarea de catre echipa de proiectare Confind a celor doua rezervoare noi de stocare produse petroliere
- Aprovizionarea materialelor pentru executia subansamblelor rezervoarelor si a liniilor izometrice
- Uzinarea la sectia de cazangerie Confind a tuturor subansamblelor ce intra in componenta rezervoarelor si a legaturilor conducte
- Transportul reperelor in santier cu autocamioane din parcul auto Confind
- Montajul reperelor in santier cu echipe de lucratori(lacatusi mecanici,sudori) -Confind folosind tehnologii de montaj si sudura de inalta clasa.
- Coordonarea in santier a echipelor de lucratori(lacatusi mecanici,sudori) de catre o echipa de proiect compusa din ingineri si maistri Confind.

2.2 Valoare proiect

Valoarea intregului proiect "Modernizare Depozit Bacau-Constructie Rezervoare si legaturi conducte" a fost in cuantum de **4,713,790.87 euro** si a fost impartita dupa cum urmeaza:

- Constructie rezervoare-**2,659,593.82euro**
- Executie legaturi conducte si montaj echipamente-**1,896,165.33euro**
- Generalitati(organizare de santier,documente relvante)- **158,031.72euro**

2.3 Etape de finalizare(Milestones)

Data de start a proiectului "Modernizare Depozit Bacau-Constructie Rezervoare si legaturi conducte" a fost **01.09.2012**, si a inceput cu partea de proiectare rezervoare. Data de start a lucrarilor mecanice a fost **28.02.2013** iar data de finalizare a lucrarilor mecanice a de **15.10.2013**.Data de punere in functie a intregului depozit este de **31.03.2014**.

Conform contract in cadrul proiectului TPCW sint 6 Milestones (etape de finalizare) pe obiective, asa cum sint prezentate in tabelul de mai jos:





CONFIND

S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei

Annex 1 to Appendix to Tender
TANK AND PIPING CONSTRUCTION WORKS FOR
BACAU STORAGE DEPOT

Mile stone No.	DESCRIPTION	MILESTONE DEFINITENESS	Milestone completion date	Milestone Achieved date
1	Milestone no.1 - Detail design ready	M0 + 150 days	28th of January 2013	28th of January 2013
2	Milestone no.2 - Mobilization on site ready - Site organization - Fence around site organization - Site org utilities connection - Roads arrangement & signs - Communication systems up & running; - Protection by guard	M0 + 181 days	28th of February 2013	28th of February 2013
3	Milestone no.3 - Procurement and manufacturing of steel plates finished	M0 + 181 days	28th of February 2013	28th of February 2013
4	Milestone no.4 - Tanks ready – (TBD) - Mechanical erection - Hydro test for inner - outer tank - Vacuum test for double bottom - Vacuum test for roof - Calibration - Painting & labeling	M0 + 411 days	15st of October 2013	15st of October 2013
5	Milestone no.5 – Mechanical completion(pipes, pumps installations) - Delivery spools in site - Installation of spools - Finalization of connection(welding or flanges) - Finalization installation of valves in main piping system - Tail end connections - Non destructive tests - Painting - labeling - Ready for petroleum products	M0 + 411 days	15st of October 2013	15st of October 2013

S.C. CONFIND S.R.L. CAMPINA 105600

Str. Progresului Nr.2 Tel/Fax 0040 244 - 33 31 60; - 37 47 19

www.confind.ro e-mail : confind@confind.ro




GSI SLV
München



6	Milestone no.6 - Commissioning and start up	M0 + 576 days	31th of March 2014	
---	--	----------------------	---------------------------	--

2.4 Structura organizatorica(Organigrama Proiect)

Proiectul “Modernizare Depozit Bacau-Constructie Rezervoare si legaturi conducte” a fost coordonat de o echipa de proiect formata din ingineri si maistri cu experienta in domeniu, distribuiti pe specialitati conform organigramei de mai jos:

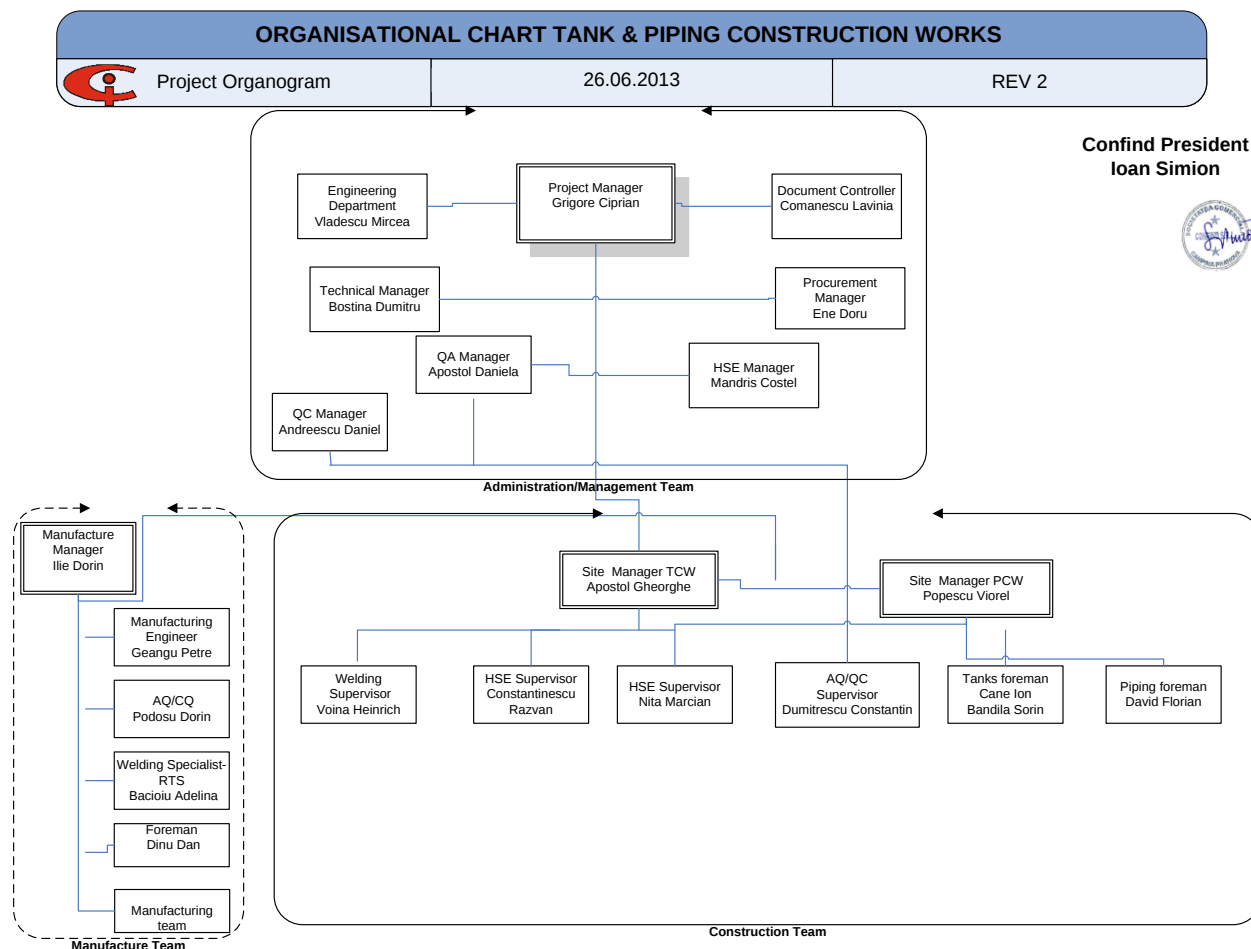

2.5 Raportare Progres

Raportarea progresului in proiectul “Modernizare Depozit Bacau-Constructie Rezervoare si legaturi conducte” a urmarit doua directii:

- Raportarea fizica a progresului a fost efectuata conform graficului de executie aprobat de beneficiar si s-a cuantificat prin rapoarte zilnice, rapoarte saptamanale,rapoarte lunare.Toate rapoartele de progress saptamanale si lunare au fost finalizate cu sedinte de progress saptamanale si lunare in care au fost dezbatute toate problemele stringente din santier la momentul respectiv.



CONFIND

S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei

- Raportarea valorica a progresului a fost efectuata conform graficului de executie aprobat de beneficiar si s-a cuantificat prin situatii de plata lunare intocmite in baza fiselor de activitate zilnica intocmite in santier.

Time data TPCW Bacau Depot

Construction Weeks	Data	Baseline/ Planned Weekly Work	Schedule d work	Percentage Baseline	Actual Work	Percentage Actual
CW36	02.09.2012	0	0	0.00%	0	0.00%
CW37	09.09.2012	10	10	0.01%	400	0.46%
CW38	16.09.2012	244	254	0.29%	850	0.99%
CW39	23.09.2012	195	449	0.52%	900	1.05%
CW40	30.09.2012	195	644	0.75%	1250	1.45%
CW41	7.10.2012	195	839	0.97%	2650	3.08%
CW42	14.10.2012	195	1034	1.20%	3400	3.95%
CW43	21.10.2012	195	1229	1.43%	4300	5.00%
CW44	28.10.2012	195	1424	1.65%	5300	6.16%
CW45	4.11.2012	195	1619	1.88%	5300	6.16%
CW46	11.11.2012	195	1814	2.11%	5600	6.51%
CW47	18.11.2012	195	2009	2.33%	5600	6.51%
CW48	25.11.2012	195	2204	2.56%	6000	6.97%
CW49	2.12.2012	165	2369	2.75%	6000	6.97%
CW50	9.12.2012	180	2549	2.96%	6000	6.97%
CW51	16.12.2012	195	2744	3.19%	7400	8.60%
CW52	23.12.2012	165	2909	3.38%	7400	8.60%
CW1	30.12.2012	0	2909	3.38%	7400	8.60%
CW2	6.01.2013	0	2909	3.38%	10200	11.85%
CW3	13.01.2013	417	3326	3.86%	10800	12.55%
CW4	20.01.2013	732	4058	4.71%	15100	17.54%
CW5	27.01.2013	975	5033	5.85%	15300	17.78%
CW6	3.02.2013	1278	6310	7.33%	15700	18.24%
CW7	10.02.2013	1684	7994	9.29%	16900	19.64%
CW8	17.02.2013	1521	9515	11.05%	17300	20.10%
CW9	24.02.2013	1778	11292	13.12%	19600	22.77%
CW10	3.03.2013	1578	12870	14.95%	20500	23.82%
CW11	10.03.2013	485	13355	15.52%	21900	25.44%

S.C. CONFIND S.R.L. CAMPINA 105600

Str. Progresului Nr.2 Tel/Fax 0040 244 - 33 31 60; - 37 47 19

www.confind.ro e-mail : confind@confind.ro



GSI SLV
München



CONFIND S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei

CW12	17.03.2013	877	14232	16.54%	22100	25.68%
CW13	24.03.2013	882	15114	17.56%	24100	28.00%
CW14	31.03.2013	837	15951	18.53%	24650	28.64%
CW15	7.04.2013	1065	17016	19.77%	26700	31.02%
CW16	14.04.2013	1369	18385	21.36%	28365	32.96%
CW17	21.04.2013	2142	20527	23.85%	30195	35.08%
CW18	28.04.2013	2127	22653	26.32%	31875	37.03%
CW19	05.05.2013	749	23402	27.19%	33695	39.15%
CW20	12.05.2013	1893	25295	29.39%	35365	41.09%
CW21	19.05.2013	2934	28229	32.80%	37105	43.11%
CW22	26.05.2013	2543	30772	35.75%	40515	47.07%
CW23	02.06.2013	2140	32912	38.24%	43060	50.03%
CW24	09.06.2013	2422	35334	41.05%	45095	52.39%
CW25	16.06.2013	3263	38596	44.84%	46655	54.21%
CW26	23.06.2013	3023	41619	48.35%	48455	56.30%
CW27	30.06.2013	2217	43836	50.93%	50855	59.09%
CW28	07.07.2013	3358	47194	54.83%	53485	62.14%
CW29	14.07.2013	3261	50455	58.62%	56045	65.12%
CW30	21.07.2013	3328	53782	62.49%	58695	68.19%
CW31	28.07.2013	3377	57159	66.41%	62120	72.17%
CW32	04.08.2013	3861	61019	70.89%	63200	73.43%
CW33	11.08.2013	4790	65809	76.46%	65975	76.65%
CW34	18.08.2013	2301	68110	79.13%	68655	79.77%
CW35	25.08.2013	3298	71408	82.96%	71432	82.99%
CW36	01.09.2013	4358	75765	87.82%	75768	87.93%
CW37	08.09.2013	3061	78826	91.58%	79565	92.44%
CW38	15.09.2013	1914	80740	93.81%	81795	95.03%
CW39	22.09.2013	1718	82458	95.80%	82650	96.03%
CW40	29.09.2013	1120	83578	97.10%	84403	98.06%
CW41	06.10.2013	951	84529	98.21%	85225	99.02%
CW42	13.10.2013	754	85283	99.09%	85565	99.41%
CW43	20.10.2013	399	85682	99.55%	85992	99.91%
CW44	27.10.2013	268	85950	100.00%	86070	100.00%

S.C. CONFIND S.R.L. CAMPINA 105600

Str. Progresului Nr.2 Tel/Fax 0040 244 - 33 31 60; - 37 47 19

www.confind.ro e-mail : confind@confind.ro



GSI SLV
München




CONFIND

S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei

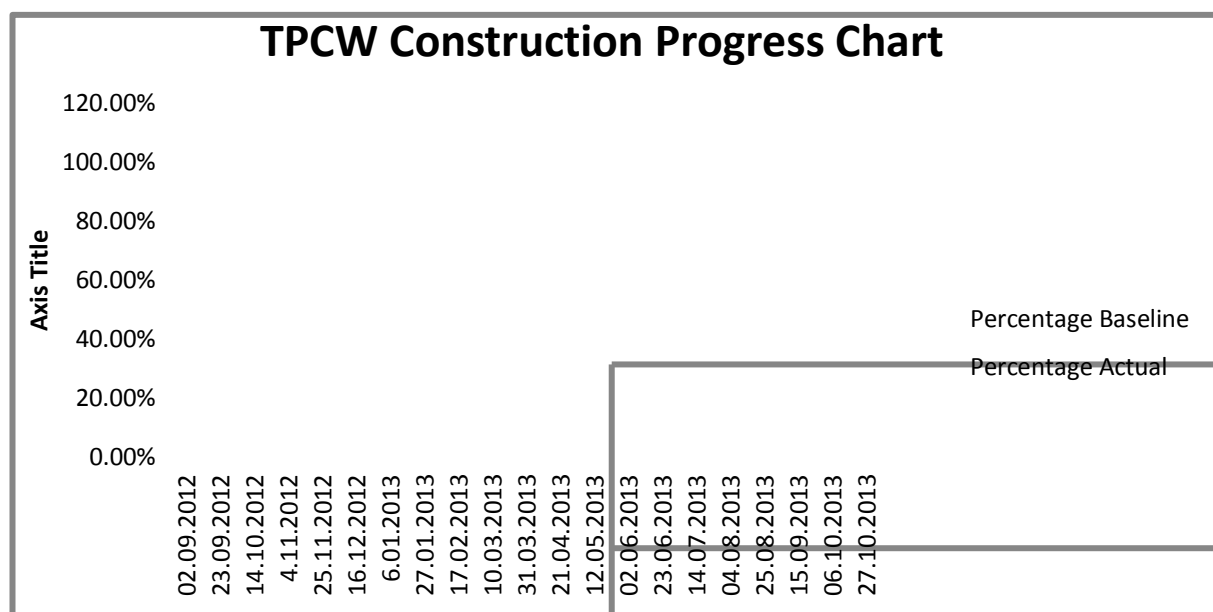

- Raportarea valorica a progresului a fost efectuata conform graficului de executie aprobat de beneficiar si s-a cuantificat prin situatii de plata lunare intocmite in baza fiselor de activitate zilnica intocmite in santier.

Urmarirea efectiva a progresului valoric fost efectuata conform graficului de mai jos:

VOWD - Value of work down TPCW Bacau Depot Revamp

Data		Bugeted cost of work scheduled BCWS			Actual cost of work performed ACWP		
		Monthly	Cumulated	Percentage	Monthly	Cumulated	Percentage
2013	Jan-13	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	Feb-13	677,146.75	677,146.75	14.37%	658,827.62	658,827.62	13.98%
	Mar-13	638,061.00	1,315,207.75	27.90%	785,630.00	1,444,457.62	30.64%
	Apr-13	601,226.00	1,916,433.75	40.66%	687,258.00	2,131,715.62	45.22%
	May-13	370,000.00	2,286,433.75	48.51%	375,850.00	2,507,565.62	53.20%
	Jun-13	270,000.00	2,556,433.75	54.23%	250,451.00	2,758,016.62	58.51%
	Jul-13	399,571.00	2,956,004.75	62.71%	401,252.00	3,159,268.62	67.02%
	Aug-13	300,000.00	3,256,004.75	69.07%	268,756.00	3,428,024.62	72.72%
	Sep-13	619,000.00	3,875,004.75	82.21%	780,299.00	4,208,323.62	89.28%
	Oct-13	719,869.00	4,594,873.75	97.48%	480,599.00	4,688,922.62	99.47%
	Nov-13	118,946.00	4,713,819.75	100.00%	24,896.00	4,713,818.62	100.00%

S.C. CONFIND S.R.L. CAMPINA 105600

Str. Progresului Nr.2 Tel/Fax 0040 244 - 33 31 60; - 37 47 19

www.confind.ro e-mail : confind@confind.ro




GSI SLV
München



CONFIND S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei

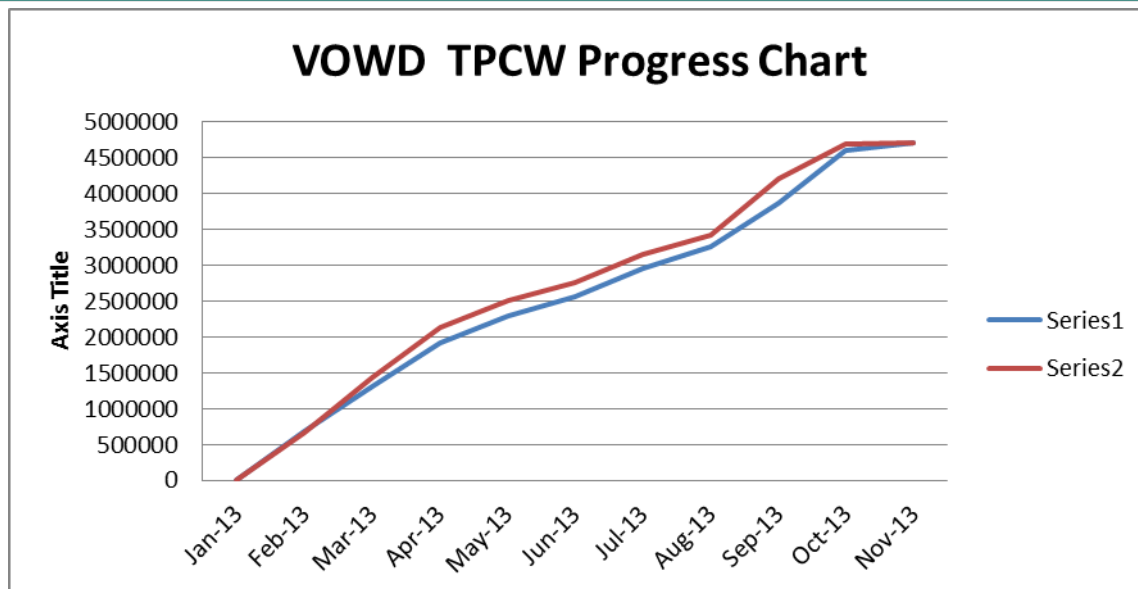

2.6 QAI/QC

Proiectul “Modernizare Depozit Bacau-Constructie Rezervoare si legaturi conducte” din punct de vedere al calitatii a fost urmarit atat in faza de uzinare a reperelor cat si in faza de montaj in santier sa indeplineasca cerintele standardelor de calitate implementate de SC Confind SRL cat si a standardelor de specialitate SR EN 14015 si SR EN 13480.

Pentru respectarea acestor standard de control si asigurare a calitatii au fost concepute metode de lucru, aprobate de beneficiar prin sistemul de monitorizare a proiectului “Share Point”.

In faza de uzinare a reperelor urmarirea din punct de vedere al controlului calitatii a fost efectuata de reprezentantii sectiei Confind unde au fost uzinate reperele, in baza “PIT-Plan de Inspectie si Testare” elaborate de departamentul de Control al calitatii si aprobat de Beneficiar. Progresiv cu livrarea reperelor in santier au fost efectuate receptii calitative impreuna cu reprezentantii beneficiarului.

In faza de montaj in santier a reperelor urmarirea punct de vedere al controlului calitatii a fost efectuata de reprezentantii din santier Confind in baza “PIT-Plan de Inspectie si Testare” elaborate de departamentul de Control al calitatii si aprobat de Beneficiar. Fiecare faza din “PIT-Plan de Inspectie si Testare” a fost concretizata cu un document de calitate intocmit si semnat de contractor si beneficiar.

2.7 HSE

Din punct de vedere HSE acest proiect a insemnat pentru CONFIND o etapa a drumului propus spre obtinerea unei CULTURI a sigurantei, cerinta prioritara a Beneficiarului lucrarii : zero incidente / accidente de munca .Printr-un Management HSE bine integrat in Managementul Companiei avand un FEEDBACK eficient, lucrarile proiectului “Modernizare Depozit Bacau-Constructie Rezervoare si legaturi conducte” au avut la baza siguranta si securitatea tuturor operatiilor efectuate, responsabilitatea sociala si sustenabilitatea.





CONFIND

S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei

Fiecare etapa a lucrarilor efectuate de CONFIND in cadrul lucrarilor de constructie rezervoare si legaturi conducte, mai inainte de problemele productive a tinut cont de cerintele Legii 319/2006 (a Sanatatii si Securitatii in Munca) ,a Standardelor HSEQ OMV PETROM care sunt aliniate celor 12 elemente ale Politicii HSEQ OMV PETROM, a Procedurile de lucru si operationale specifice, de cele 8 REGULI DE AUR OMV PETROM si nu in ultimul rand de ultima editie a POLITICII DE SUSTENABILITATE HSE A OMV PETROM SA.

Orice activitatea efectuata la Constructia de rezervoare (inclusiv pentru Subcontractori) a avut la baza o evaluare a riscurilor, o evaluare / selectie a fortei umane , de dorit facuta pe termen lung ,a carei eficacitate a constientizarii lucratorilor s-a urmarit prin instruri **TOOLBOX MEETING**-uri planificate si neplanificate.

De-a lungul lucrarilor efectuate de catre CONFIND in anul 2013 pe primul loc a fost Forta umana care a trebuit sa fie cu maxima atentie gestionata de catre Managementul Firmei printr-un Program preventiv din care sa nu lipseasca ergonomia locurilor de munca , sanatatea si siguranta lucratorilor.

Lucrand impreuna cu beneficiarul lucrarii OMV PETROM), CONFIND s-a asigurat in orice moment ca riscurile pentru oameni, comunitate sau mediu, prin actiunile ce s-au intreprins sa fie reduse la un nivel cat de scazut posibil din punct de vedere practic, fapt pentru care s-a asteptat implicare si competenta din partea intregii echipe de proiect, pentru ca orice deviere de la competenta IMPLICA UN RISC PENTRU AFACERE.

PERFORMANTE HSE

TPCW Bacau -2012-2013

Accident & injury information

Evolutia numarului de ore la sfarsitul perioadei si a LTIR

Descriere	Sfarsit Trim IV 2012	Trim. I 2013	Trim. II 2013	TRIM III 2013
Fist Aid FAI	0	0	0	0
Accidente usoare (incidente cu trat. Medic.) MTI	0	0	0	0
Restrictii medic. (dupa accident) RW	0	0	0	0
Accid. Munca LTI	0	0	0	0
Deces FAT	0	0	0	0
Total hours	2999	15951	43836	85950
Total of injuries	0	0	0	0
LT&I Rate: Totalx200000/Total hours	0	0	0	0

Evolutia numarului de ore proiect (sept. 2012-sept2013)

Zero accidente , raniri,
LTIR = ZERO.






CONFIND S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei

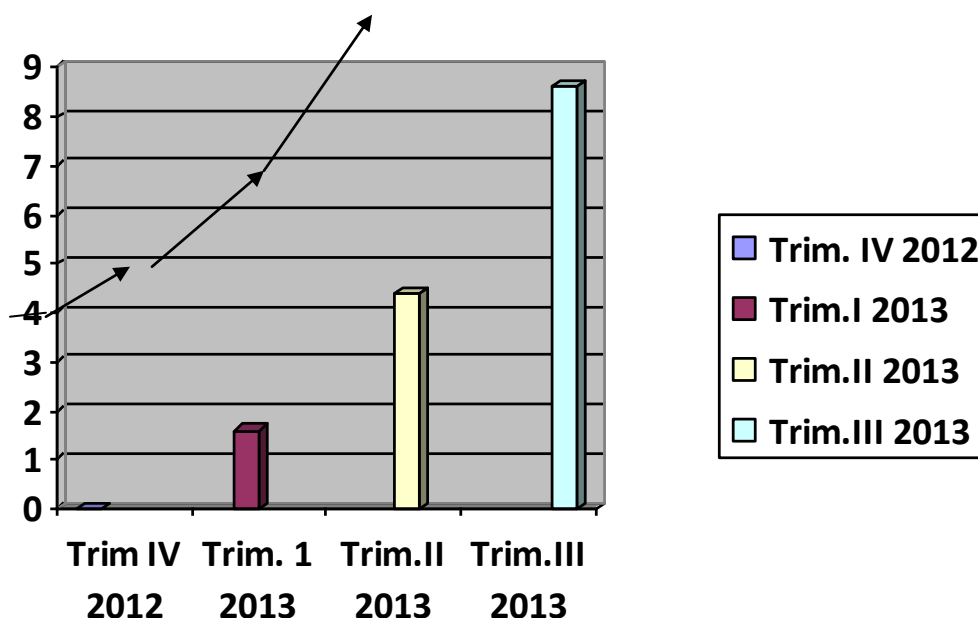

Near Miss : Lipsa imprejmuire zone periculoase , Proiectie particole operatii polizare , Leziuni oculare flama aparat sudura etc.

Causes: Eroare umana ,Organizarea locului de munca pentru situatii de Interferenta activitati

Incident la subcontractor : Rupere cabluri subterane la operatii de sapaturi mecanizate de catre subcontractor

Causes : Lucru fara o scanare a zone de lucru, semnata de beneficiar si vizualizata de Contractor

Explicatie (Termeni folositi)

FAI – incident urmat de acordarea de prim ajutor –raniri usoare care nu necesita prim ajutor, sau da, cum ar fi : bandajari, etc.

FAR –rata de deces –Numarul de decese din randul angajatilor proprii si / sau a contractorilor;

(FAR = (FAT/ore lucrate)x200.000)

FAT- fatalitate – un deces ce rezulta dintr-un accident ce are legatura cu munca (deces in cel mult 12 luni de la data producerii accidentului, ca urmare al acestuia)

Ore lucrate –numar total e ore realizate de salariati (proprii + contractori)

Zile de lucru pierdute –numar de zile pierdute datorita unui accident, incluzand si zilele de sarbatori legale (includ LWDI si LTI)





CONFIND S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei

LWDI –accident cu ITM – accident, mai puțin deces, care are incapacitate de muncă (ITM)

LTI-accident cu timp pierdut (lost time injury)– suma accidentelor având ca rezultat deces, invaliditate, plus cele cu ITM (LWDI); ($LTI = FAT + LWDI$)

LTIR-frecvența accidentelor cu timp pierdut- cifra care ajută la evaluarea frecvenței accidentelor cu ITM ;($LTIR = LTI / \text{ore lucrate} \times 200.000$)

LTIS-severitatea accidentelor cu timp pierdut –cifra care descrie severitatea medie a unui LTI, în raport cu timpul de lucru realizat ;($LTIS = \text{zile de lucru pierdute} / \text{ore lucrate} \times 200.000$)

MTI-incidente cu tratament medical – accident în legătură cu munca, mai puțin sever decât cele cu ITM sau deces, însă mai puțin decât cele care necesită un simplu tratament de prim ajutor (FAI)

Incident fără urmări (Near miss)-incident care nu a avut consecințe asupra oamenilor sau bunurilor, dar care ar fi putut duce la un accident de muncă sau la pierderi.

-**RWI**-accident de muncă urmat de restricționarea activității – când un salariat poate să-și reia activitatea după un accident de muncă, însă cu restricții (în special recomandări medicale)

-**TRI**-numărul total de accidente raportabile- $TRI = FAT + LTI + RWI + MTI$ (număr)

-**TRIR**-frecvența accidentelor raportabile-cifra care ajută la evaluarea frecvenței medii a incidentelor în raport cu timpul lucrat ; ($TRIR = TRI / \text{ore lucrate} \times 200.000$)

-**Act nesigur**- comportament nesigur care în condiții diferite ar putea conduce la un incident

3.0 Documentație fotografică

3.1 Documentație fotografică rezervoare





CONFIND S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei



S.C. CONFIND S.R.L. CAMPINA 105600

Str. Progresului Nr.2 Tel/Fax 0040 244 - 33 31 60; - 37 47 19

www.confind.ro e-mail : confind@confind.ro



GSI SLV
München



CONFIND S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei



S.C. CONFIND S.R.L. CAMPINA 105600

Str. Progresului Nr.2 Tel/Fax 0040 244 - 33 31 60; - 37 47 19

www.confind.ro e-mail : confind@confind.ro



GSI SLV
München



CONFIND S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei



S.C. CONFIND S.R.L. CAMPINA 105600
Str. Progresului Nr.2 Tel/Fax 0040 244 - 33 31 60; - 37 47 19
www.confind.ro e-mail : confind@confind.ro



GSI SLV
München



CONFIND S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei



3.1 Documentatie fotografica legaturi conducte



S.C. CONFIND S.R.L. CAMPINA 105600

Str. Progresului Nr.2 Tel/Fax 0040 244 - 33 31 60; - 37 47 19

www.confind.ro e-mail : confind@confind.ro



GSI SLV
München



CONFIND S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei



S.C. CONFIND S.R.L. CAMPINA 105600

Str. Progresului Nr.2 Tel/Fax 0040 244 - 33 31 60; - 37 47 19

www.confind.ro e-mail : confind@confind.ro



GSI SLV
München



CONFIND S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei



S.C. CONFIND S.R.L. CAMPINA 105600

Str. Progresului Nr.2 Tel/Fax 0040 244 - 33 31 60; - 37 47 19

www.confind.ro e-mail : confind@confind.ro



GSI SLV
München



CONFIND S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei



S.C. CONFIND S.R.L. CAMPINA 105600

Str. Progresului Nr.2 Tel/Fax 0040 244 - 33 31 60; - 37 47 19

www.confind.ro e-mail : confind@confind.ro



GSI SLV
München



CONFIND S.R.L.



Nr.Reg.Com. J 29/607/1991; Cod Unic RO 1324099 Cod IBAN BCR Câmpina RO43 RNCB 0208 0020 3864 0001; Capital social 33.750,00lei



**Manager Proiect
Ciprian Grigore**

S.C. CONFIND S.R.L. CAMPINA 105600
Str. Progresului Nr.2 Tel/Fax 0040 244 - 33 31 60; - 37 47 19
www.confind.ro e-mail : confind@confind.ro



GSI SLV
München
